



KickOff Dự Án Trạm Cấp 1 TP.HCM

Ngày 20/01/2026



NỘI DUNG

1 GIỚI THIỆU CHUNG

2 ĐỊNH HƯỚNG


3 MỤC TIÊU

4 THÀNH VIÊN DỰ ÁN

5 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

6 BÁO CÁO DỰ ÁN


7 QUẢN TRỊ RỦI RO



GIỚI THIỆU CHUNG


01

Project Management

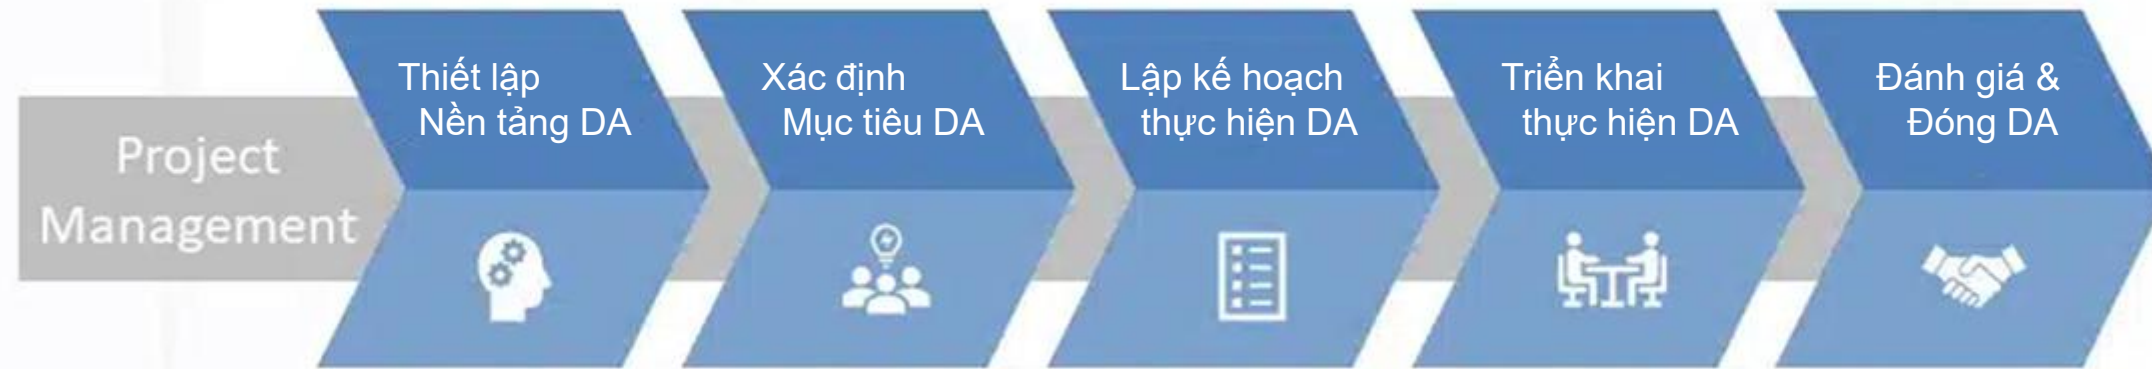

Key Activities

Định hướng của DA	Mục tiêu	Lập WBS Quản trị rủi ro Quản trị sự thay đổi	Kiểm soát RR Kiểm soát sự thay đổi	Đánh giá kết quả
Quản trị DA: Trưởng DA, Thành viên lead từng mảng DA	Phạm vi công việc Thời gian Ngân sách	Timeline và Milestones	Theo dõi tiến độ	Bài học kinh nghiệm và cải tiến
Công cụ quản lý DA: Template BC, kênh thông tin	Các bên liên quan	Xác định nhân sự thực hiện Phương thức báo cáo	Thúc đẩy team Phối hợp chéo	Chuyển giao vận hành và đóng dự án




ĐỊNH HƯỚNG

02

ĐỊNH HƯỚNG



1. Khu vực: Mở trạm xử lý tách nhãn tại TP.HCM khu vực Bình Tân, hoặc lân cận văn phòng VVK
2. Loại sản phẩm: Chai xá tròn tại TP.HCM
3. Xử lý: Phân loại, tách nhãn và ép kiện
4. Công nghệ: Tối đa tự động hóa
5. Hình ảnh: MKT hình ảnh công ty.



MỤC TIÊU

03

TỔNG THỂ VỀ DỰ ÁN



1. Mục tiêu và Phạm vi

Mục tiêu:

- Xây dựng trạm xử lý cấp 1 TP.HCM, sử dụng công nghệ autosort, công suất 500 tấn/tháng/line cho giai đoạn 1.
- Thiết kế tối ưu chi phí để có thể tăng năng suất lên 1.000 tấn/tháng.

Phạm vi:

- Thu mua chai PET xá tròn (B0) từ Vựa/Đại lý cho trạm trong giai đoạn 1.
- Xem xét thực hiện thêm chai ép kiện trong giai đoạn 2
- Thu mua chai tròn, phân loại, tách nhãn, ép kiện và giao hàng về DTR
- Khu vực: TP.HCM.



2. Thời gian

6 tháng (02/01/2026 - 30/6/2026)

02/01 – 31/05: Triển khai mua và lắp đặt MMTB

01/06 – 15/06: Vận hành thử nghiệm, cải tiến

16/06 – 18/08: Vận hành chính thức



3. Ngân sách đầu tư

MMTB: 15,2 tỷ VNĐ

CSHT: 1,3 tỷ VNĐ

Tổng: 16,5 tỷ VNĐ

Mục tiêu cụ thể cho dự án

Mục tiêu	02/01 - 31/05	01/06 – 30/06	01/7 – 30/9	01/10 – 31/12
SẢN LƯỢNG (tấn/tháng)	0	100	250	500
KHÁCH HÀNG VÀ ĐỘ PHỦ	- Lập sơ đồ tuyến: ✓ Danh sách ĐTM ✓ Tuyến ✓ Route tuyến (khu vực)	- Hoàn thiện sơ đồ tuyến - Độ bao phủ tối thiểu 10% (số NCC)	Độ bao phủ tối thiểu 25% (số NCC)	Độ bao phủ tối thiểu 50% (số NCC)
QUY TRÌNH VÀ HỆ THỐNG	- Hoàn thành Thiết lập trạm: ✓ CSHT trạm ✓ Lắp đặt & Vận hành thử nghiệm máy. ✓ Hệ thống vận hành (Mua hàng, SX, bán hàng, 3Q, Nhân sự, kiểm soát...)	- Vận hành thử nghiệm. - Golive SAP, VMS, SMS - Đề xuất cải tiến	- Kiểm soát quy trình - Theo dõi dịch vụ khách hàng - Triển khai các hoạt động trade (tăng sản lượng)	- Vận hành Trạm và Chuỗi cung ứng trên nền tảng số (SAP, SMS, VMS 100%) - Theo dõi vận hành kênh loyalty
ĐÀO TẠO	- Đào tạo cơ bản vận hành Ver.1 ✓ Mua hàng ✓ Sản xuất ✓ MMTB	- Đào tạo vận hành Ver.2 ✓ Chất lượng ✓ Sản xuất ✓ Bán hàng/dịch vụ ✓ Cải tiến		Đánh giá hoàn thiện và cập nhật Chương trình đào tạo
	90% nhân sự hoàn thành đào tạo kỹ năng cơ bản	100% nhân sự hoàn thành đào tạo cơ bản Ver.1 50% nhân sự hoàn thành đào tạo Ver. 2		Duy trì 100% nhân sự hoàn thành đào tạo

Mục tiêu cụ thể cho các phòng ban trong giai đoạn thiết lập (set up)

PHÒNG BAN		02/01 - 31/01	01/02 – 28/02	01/03 – 31/03
TÀI CHÍNH			• Theo dõi, quản lý ngân sách	
BDS	- Xin chủ trương phê duyệt của HEPZA - Chọn Mặt bằng phù hợp và được phê duyệt		• Hoàn thiện các thủ tục thuê mặt bằng	
PHÁP LÝ			- Giấy phép đầu tư - Giấy phép hoạt động: ✓ Giấy ĐKKD ✓ Đăng ký Môi trường ✓ Giấy phép PCCC	
XDCB			- Khảo sát CSHT - Cải tạo CSHT	• Buffer cải tạo CSHT
KỸ THUẬT	- Thiết kế layout sơ bộ - Đề xuất đầu tư MMTB mua lâu		- Khảo sát điều kiện kỹ thuật mặt bằng. - Đề xuất cải tạo kỹ thuật. - Thiết kế layout chi tiết - Đề xuất đầu tư MMTB phụ	
MUA HÀNG			- Tìm NCC, lên hợp đồng mua MMTB nước ngoài. - Tìm NCC, mua MMTB phụ	
TRẠM	- Thiết lập định hướng chiến lược, hoạt động, KPIs - Thiết lập hệ thống quản trị (SĐTC, MTCV, DOA,...) - Thiết lập hệ thống quản lý (QLTT) và vận hành (3Q)			
NHÂN SỰ			• Thuê bảo vệ (sau khi thuê MB)	• Tuyển dụng kỹ thuật (lắp đặt và vận hành máy)
HÀNH CHÍNH			- Văn phòng và tiện ích (nhà ăn, camera an ninh,...) - Giấy phép/thủ tục hành chính	


10/16

Mục tiêu cụ thể cho các phòng ban trong giai đoạn thiết lập (set up)

PHÒNG BAN	01/04 - 30/04	01/05 – 31/05	01/06 – 31/06
CUNG ỨNG	Hoàn thiện hệ thống data thị trường	Mua hàng thử nghiệm	Mua hàng chính thức
HSE	- Xây dựng hệ thống HSE - Đề xuất trang bị HSE		
MUA HÀNG	- Mua bổ sung đầy đủ MMTB phụ, trang bị HSE - Thủ tục nhập MMTB nước ngoài - MMTB về đầy đủ 20/04	Mua vật tư sản xuất	
KỸ THUẬT		- Lắp đặt MMTB - Vận hành thử nghiệm MMTB (23/5)	Chính thức vận hành (15/6)
TRẠM	Đề xuất vật tư sản xuất	Vận hành thử nghiệm toàn hệ thống (23/5)	Chính thức vận hành (15/6)
CHẤT LƯỢNG	- Hoàn thiện bộ TCKT input, output - Hệ thống QLCL (3Q)	Vận hành thử nghiệm toàn hệ thống (23/5) toàn hệ thống	Chính thức vận hành (15/6)
CNTT	- Triển khai SAP phân hệ FI – MM - Triển khai SMS, VMS - Triển khai Loyalty - Hệ thống báo cáo BI	Triển khai toàn bộ phân hệ SAP	
NHÂN SỰ		- Tuyển dụng LĐPT - Đào tạo LĐPT	Chính thức vận hành (15/6)
TÀI CHÍNH	Theo dõi, quản lý ngân sách		

Mục tiêu cụ thể cho các phòng ban trong giai đoạn vận hành


PHÒNG BAN	01/07 – 31/07	01/08 – 30/09	01/10 – 31/12
CUNG ỨNG	- Kết quả sản lượng tháng 7 - Kết quả độ phủ tháng 7	- Kết quả sản lượng quý 3 - Kết quả độ phủ quý 3	- Kết quả sản lượng quý 4 - Kết quả độ phủ quý 4
TRẠM	• Quản lý sản xuất theo KPIs		
CHẤT LƯỢNG	• Quản lý chất lượng in, out theo KPIs		
TÀI CHÍNH	• Quản lý tài chính vận hành theo KPIs		
HCNS	• Quản lý nguồn nhân lực, HSE		



THÀNH VIÊN DỰ ÁN

04


Thành viên dự án

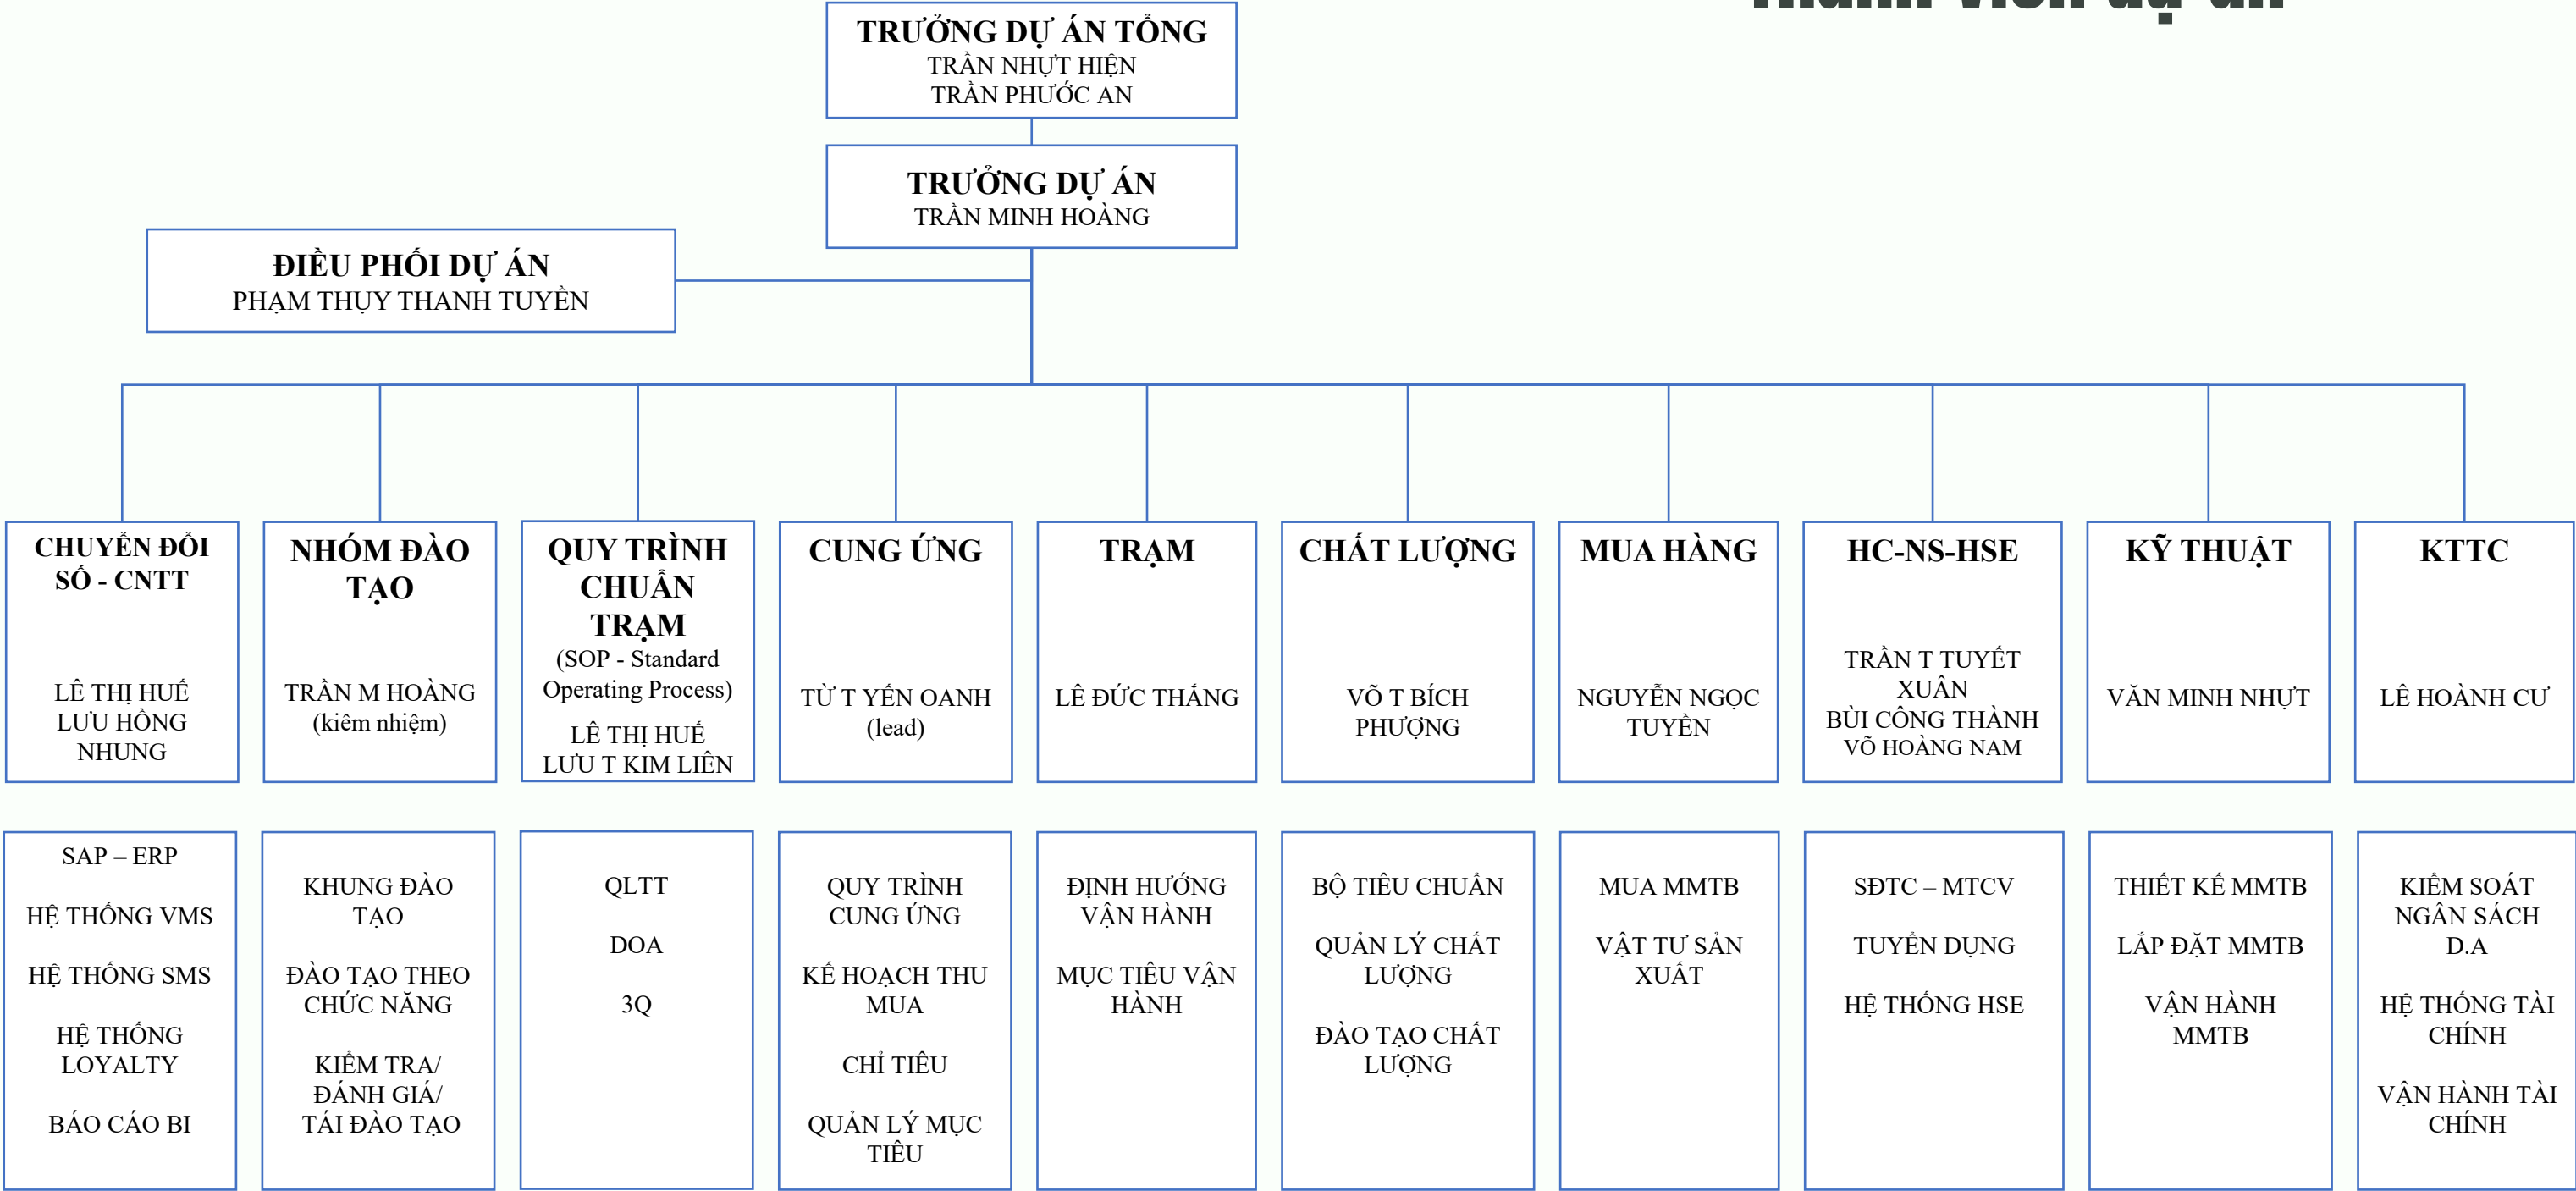

05

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

TỔNG QUAN CÁC GIAI ĐOẠN DỰ ÁN

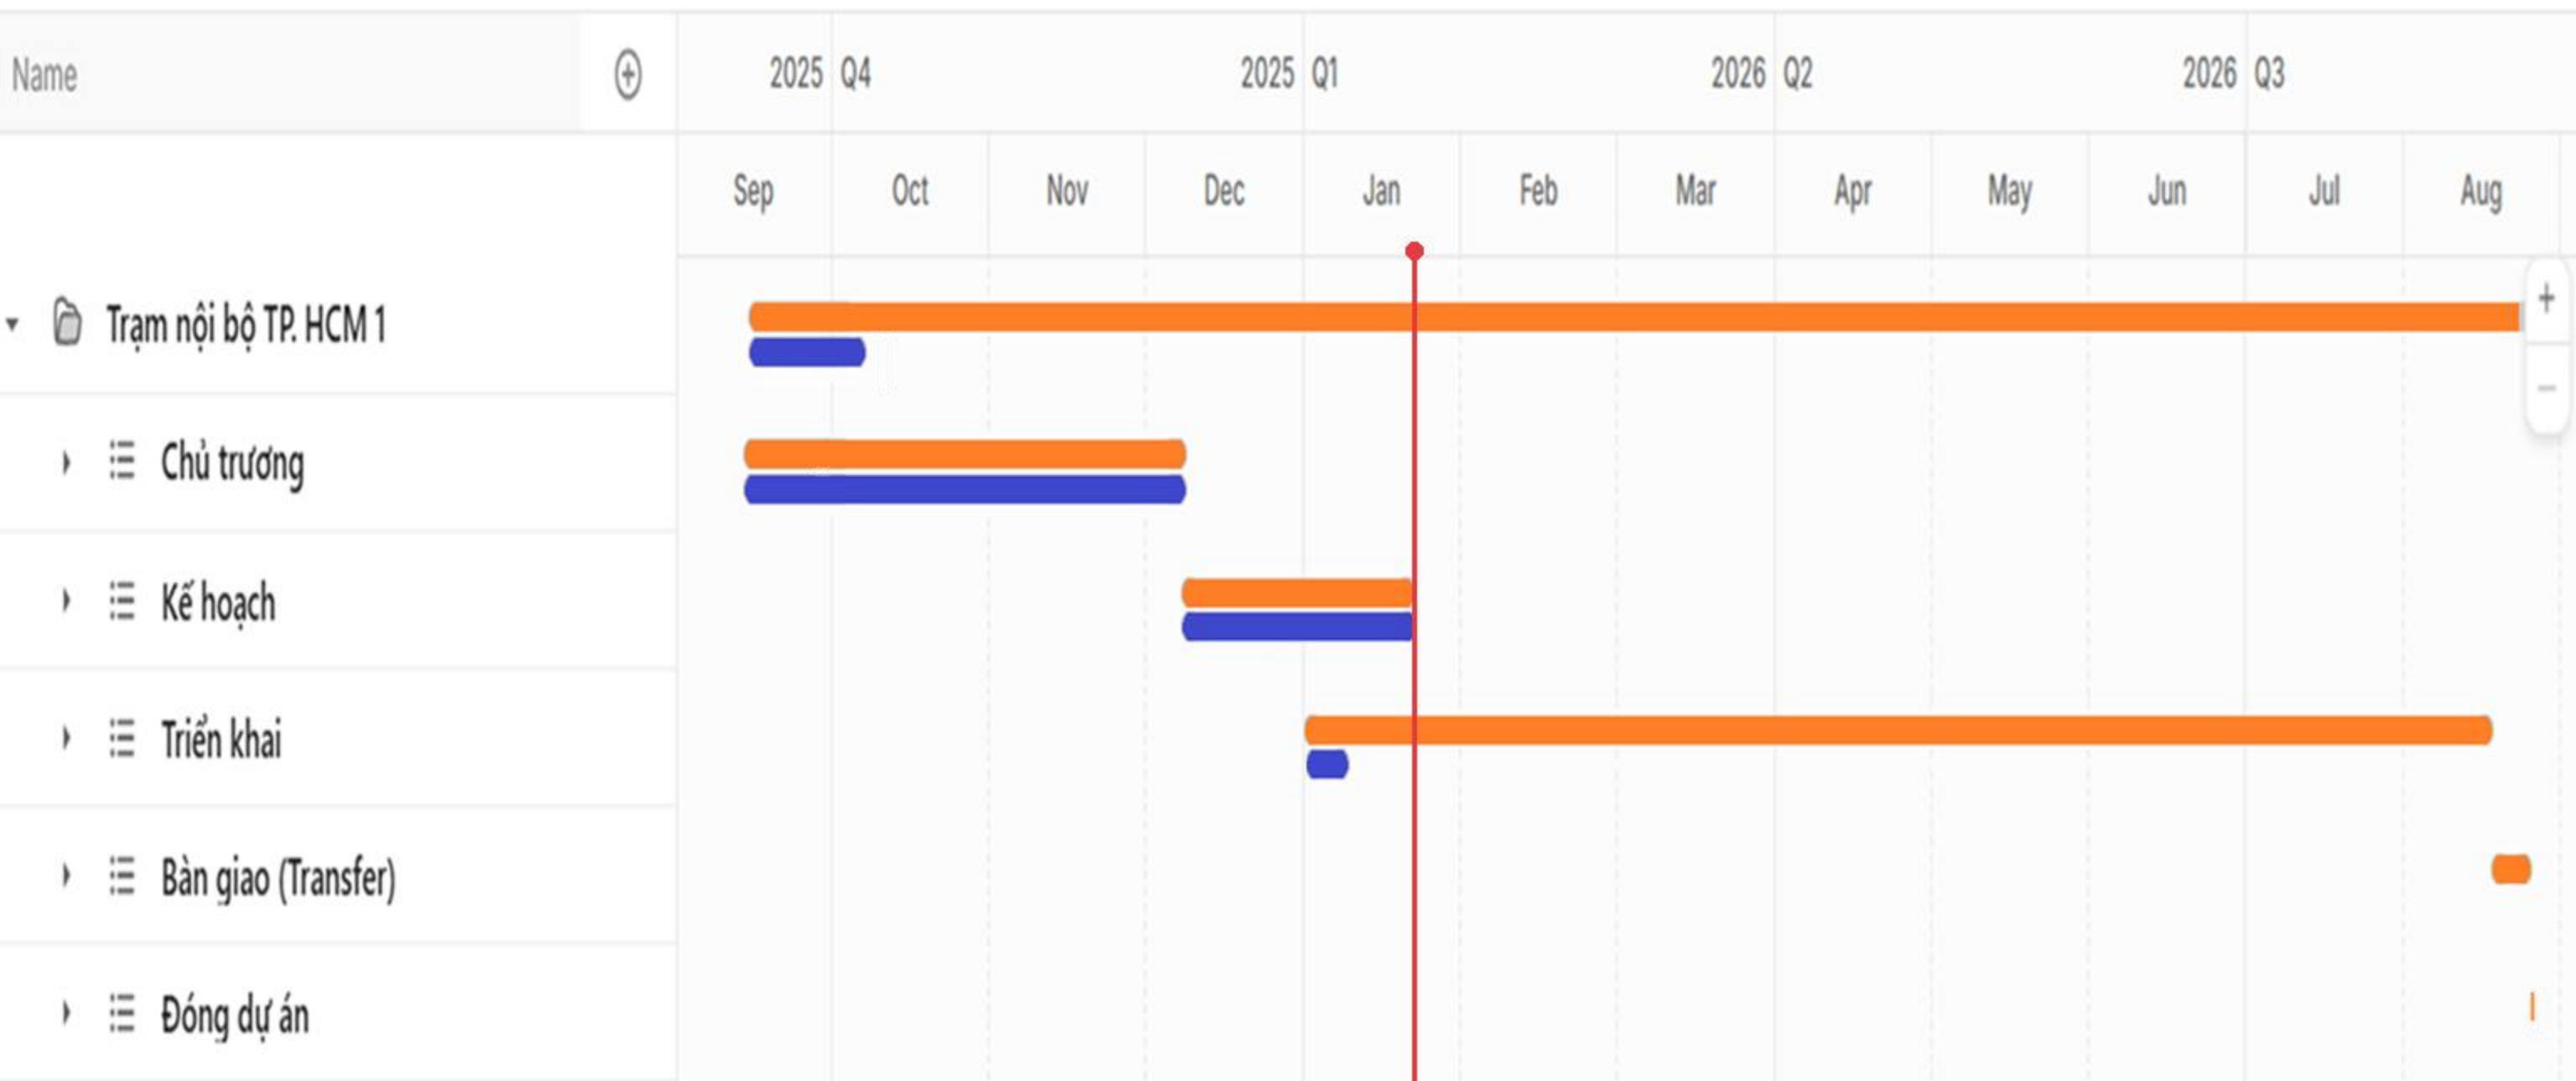



Kế hoạch



Thực hiện

DANH MỤC CÔNG VIỆC

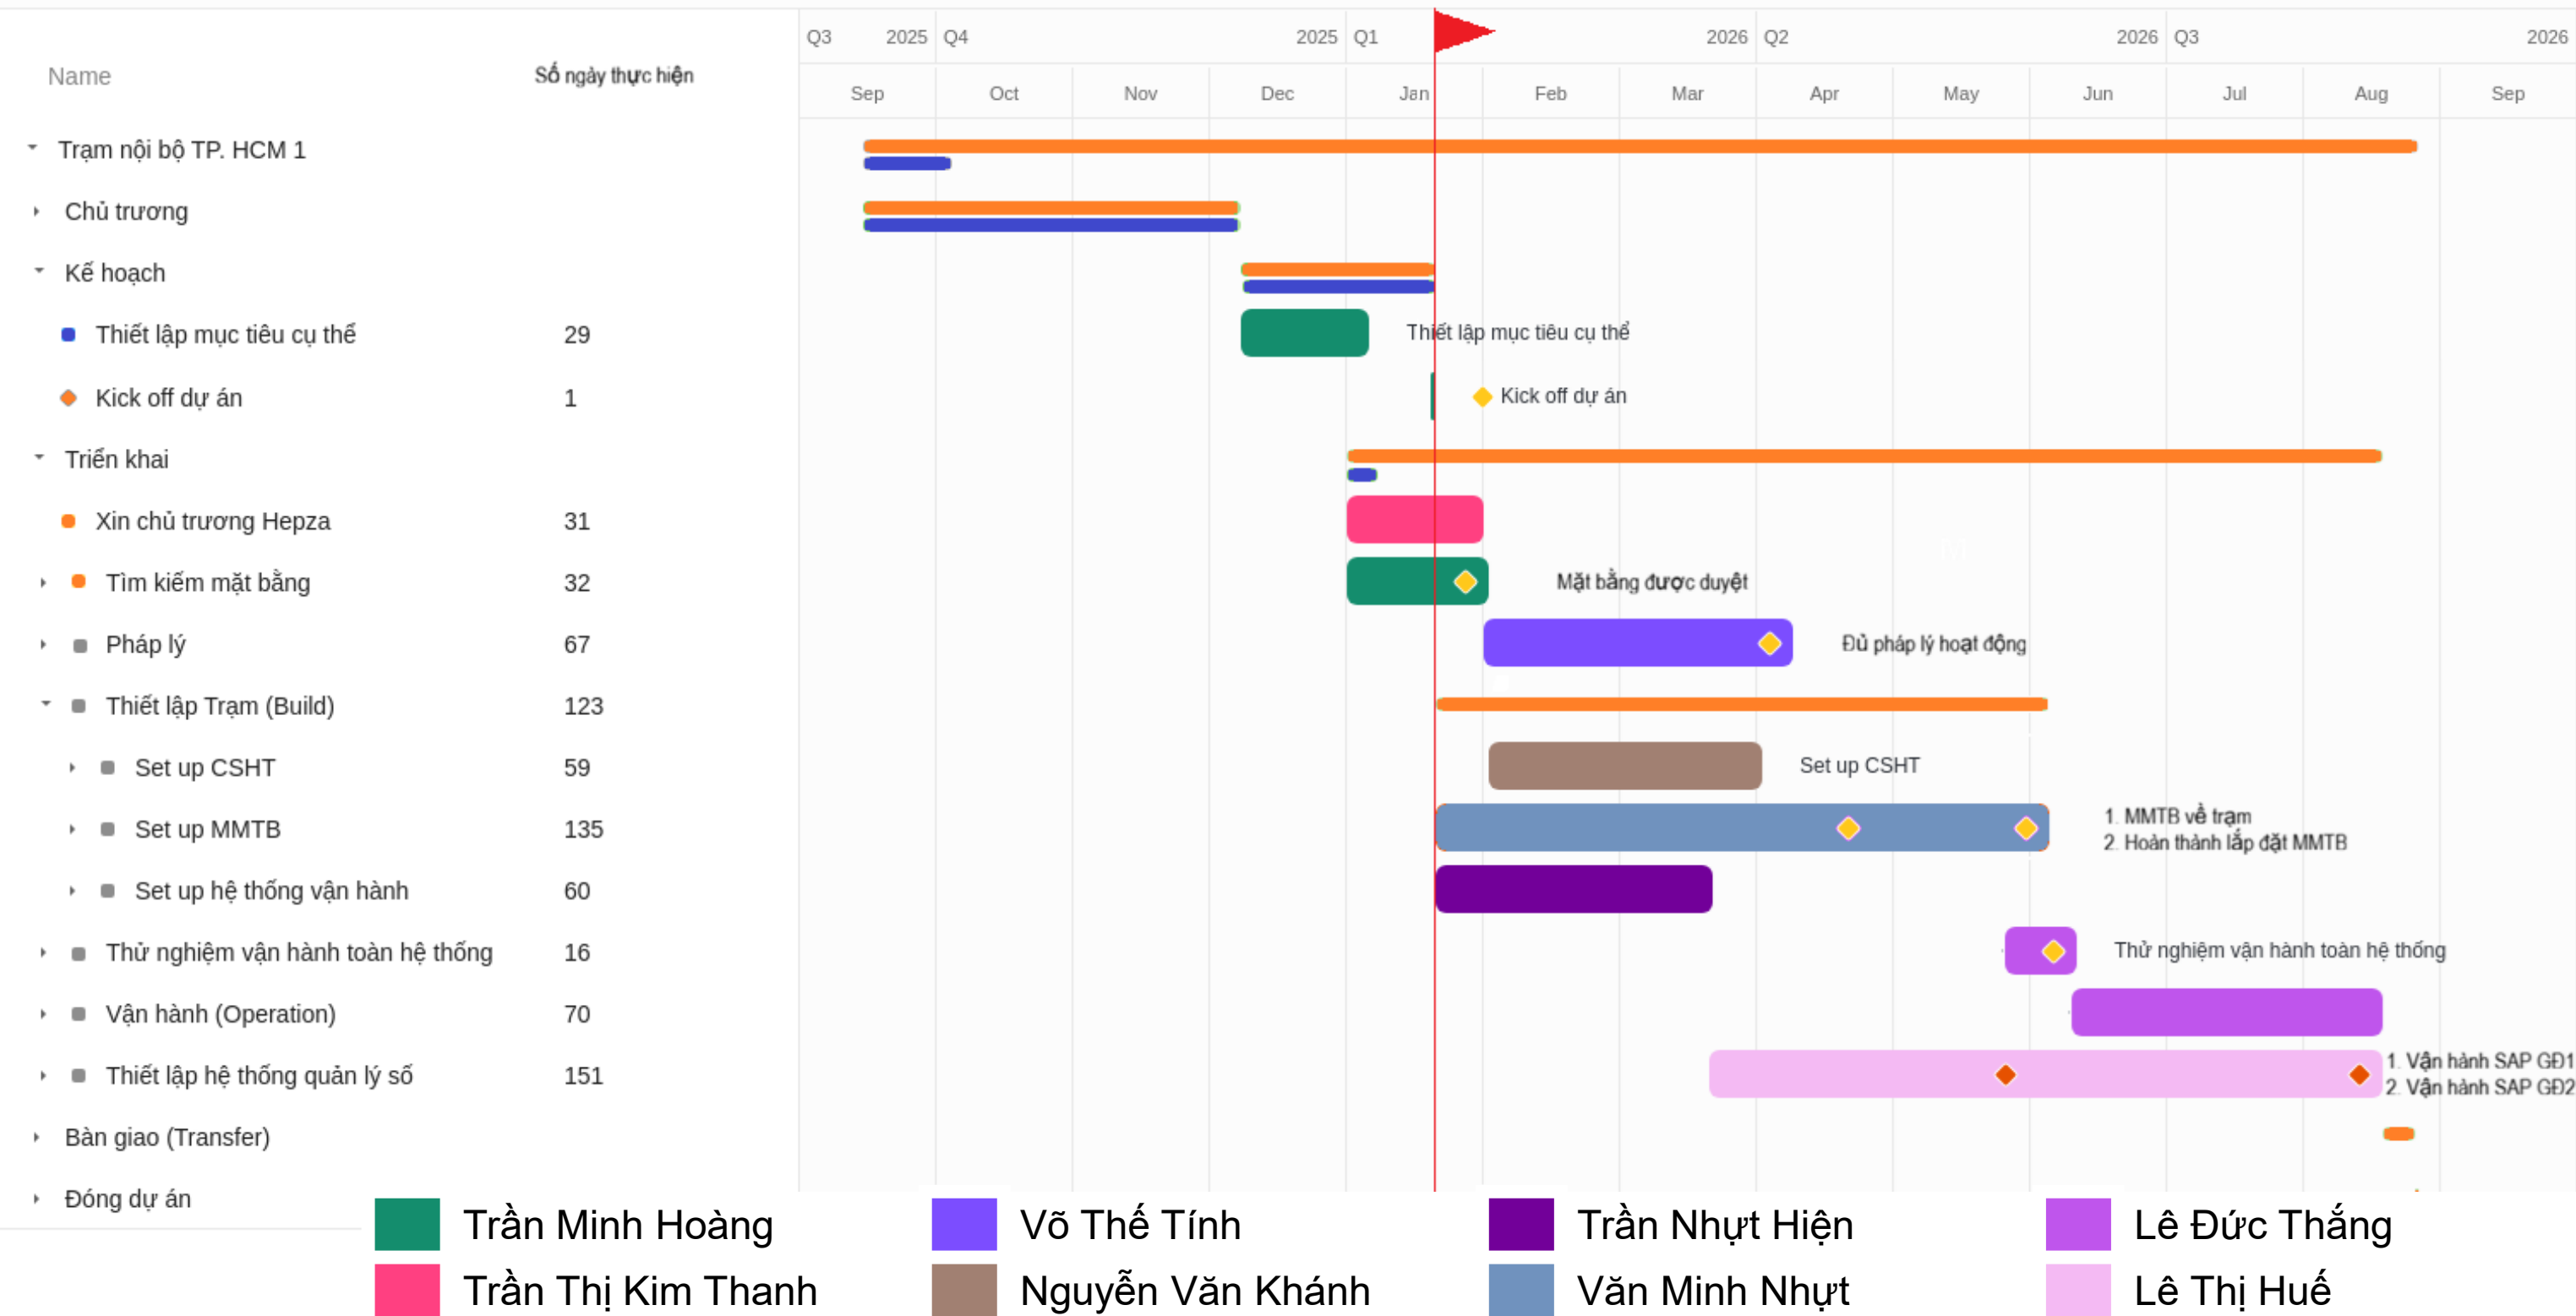




BÁO CÁO DỰ ÁN

06

Hợp định kỳ và báo cáo

Thành viên	Tần suất	Mục tiêu - Nội dung	Thời gian (Tháng/Tuần)																								
			Tháng 1				Tháng 2				Tháng 3				Tháng 4				Tháng 5				Tháng 6				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Pháp lý	1 tuần/lần	Tiến độ pháp lý, giấy phép hoạt động của Trạm	Xin chủ trương				Giấy tờ pháp lý				Giấy tờ pháp lý																
Kỹ Thuật	1 tuần/lần	Tiến độ thiết kế, lắp đặt theo các giai đoạn				Thiết kế MMTB											Lắp đặt MMTB										
Mua Hàng	1 tuần/lần	Tiến độ mua MMTB									Mua sắm MMTB																
CNTT	1 tuần/lần	Tiến độ xây dựng hệ thống phần mềm và dữ liệu số										Hệ thống dữ liệu số															
HCNS	4 tuần/lần	Tiến độ xây dựng quy trình hoạt động, 3Q Tiến độ tuyển dụng NS			HC			Tuyển dụng				HC					NS				HSE						
Chất lượng	1 tuần/lần	Đào tạo chất lượng Chất lượng hàng hóa thu mua, sản xuất"																		Tiêu chuẩn	Vận hành, kiểm tra, báo cáo						
Cung Ứng	1 tuần/lần	Tiến độ thu mua Các giải pháp để đạt được mục tiêu."													Kế hoạch		Vận hành, kiểm tra, báo cáo										
Trạm	1 tuần/lần	Sản xuất và các vấn đề vận hành																Vận hành, kiểm tra, báo cáo									



QUẢN TRỊ RỦI RO

07

RỦI RO & KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ							
ST T	Nhóm nguy cơ	Rủ ro/cơ hội	Khả năng xảy ra	Ảnh hưởng	Đánh giá	Hành động khắc phục giảm thiểu rủi ro	Hành động ứng phó khi rủi ro xảy ra
1	Sản xuất	Thay đổi phương thức xử lý: Băm vảy	1	5	5	Ký duyệt định hướng rõ ràng và phương thức sản xuất của Trạm TP.HCM và các bên liên quan trong chuỗi cung ứng: Bên liên quan nào sẽ băm vảy	
2	Loại sản phẩm	NCC có chai xá ép kiện và cần được mua.	4	1	4	Hoạch định rõ ràng mục tiêu và nguồn cung theo công suất thiết kế (500 tấn chai tròn).	Kỹ thuật thiết kế thêm khả năng xử lý chai ép kiện cho những NCC có lô hàng chai ép kiện
3	Vị trí	Không thuộc KCN và quận Bình Tân	5	3	15	Tìm kiếm các mặt bằng ngoài KCN và cả ngoài quận Bình Tân	Thuê mặt bằng bên ngoài KCN có cơ sở hạ tầng sẵn: giấy phép và PCCC
4	Sản lượng	Mua không đủ hàng hoặc lớn hơn công suất thiết kế	3	3	9	Thu thập sơ đồ tuyến 'Hoạch định rõ ràng mục tiêu và nguồn cung theo công suất thiết kế (500 tấn chai tròn). Dự phòng 150%.	Mở rộng vùng thu mua: Bình Dương, BRVT
5	Lúc giai đoạn thiết lập	- Pháp lý: không được Hepza duyệt	3	1	3		Chọn mặt bằng backup ngoài KCN
6	MMTB	- MMTB về trước	3	1	3		- Sử dụng mặt bằng Plenma

THANKS FOR WATCHING



Dự án Trạm Cấp 1 TP. HCM

Phạm vi:

- 1. Set up trạm sẵn sàng hoạt động, gồm:
 - Pháp lý và giấy phép hoạt động
 - Hệ thống MMTB, kỹ thuật tự động hóa
 - Hệ thống vận hành quản lý tập trung
- 2. Đáp ứng sản lượng về trạm, gồm:
 - Sản lượng mua theo kế hoạch.
 - Quản lý giá mua, chất lượng.
 - Các Chương trình thu hút và duy trì sản lượng

Bên tham gia:

- 1. Cung ứng
- 2. Pháp lý
- 3. Trạm
- 4. Kỹ thuật
- 5. Mua hàng - XNK
- 6. CNTT
- 7. HCNS – HSE
- 8. Tài chính

Thời gian Golive:

15/06/2026

Thời gian Nội dung công việc	Tháng 01	Tháng 02	Tháng 03	Tháng 04	Tháng 05	Tháng 06
- Xin chủ trương HEPZA và duyệt mặt bằng - Thiết kế kỹ thuật sơ bộ - đề xuất máy chính						
- Hoàn thiện pháp lý hoạt động trạm - Thuê và cải tạo CSHT - Duyệt layout chi tiết và đề xuất đủ MMTB						
- Mua MMTB - Thiết lập hệ thống vận hành, quản lý - Thiết lập hệ thống số (SAP,VMS,SMS, BI...)						
- Lắp đặt MMTB - Hoàn thiện data - xây mục tiêu mua hàng - Mua vật tư sản xuất.						
- Vận hành chính thức. - Thực hiện kế hoạch mua hàng						
